Фасад ФМ1-3 М 1:10

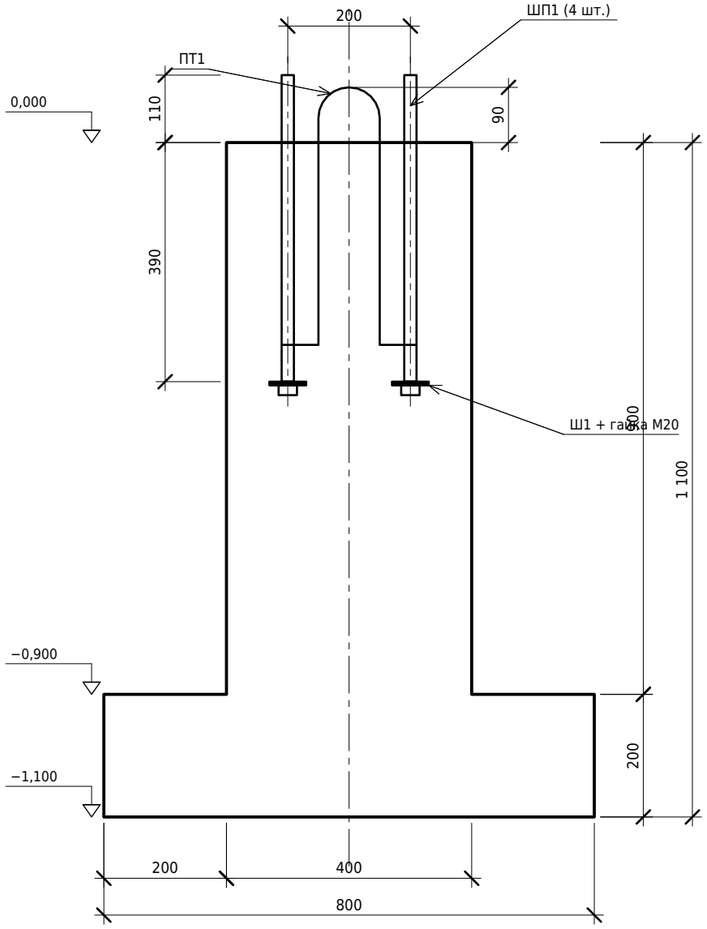

План М 1:10

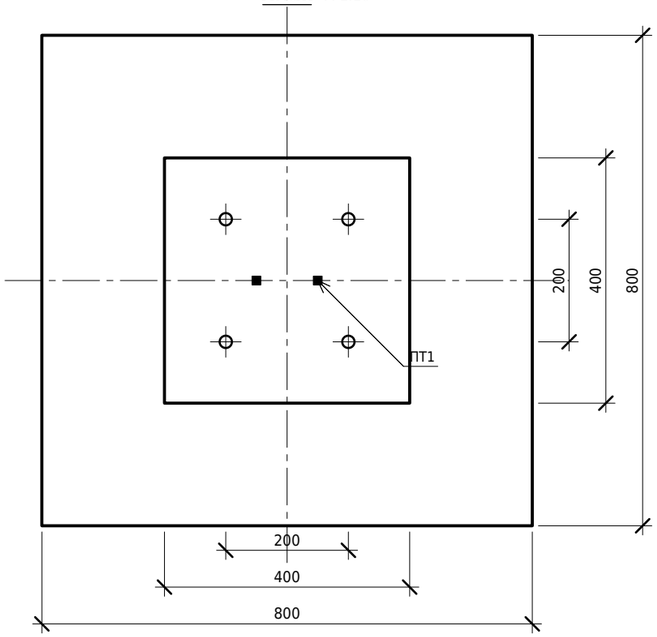

ШП1 — шпилька М20×500 з анкерною шайбою М 1:5



КД1 — кондуктор, лист −8 М 1:5

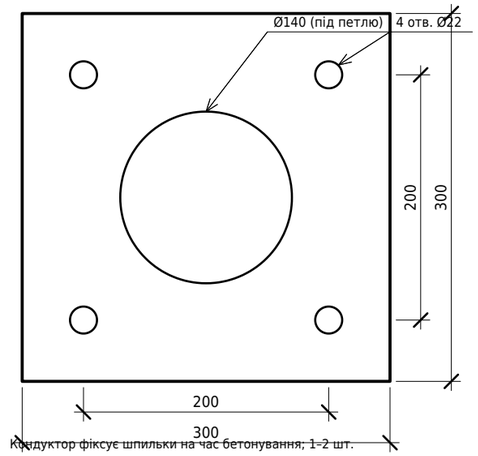

Кондуктор фіксує шпильки на час бетонування; 1–2 шт.

ПТ1 — петля Ø14 А240С М 1:5

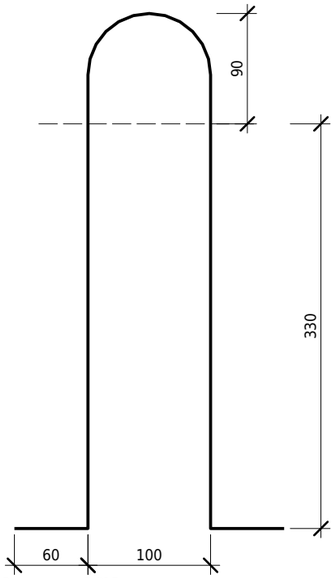

Розгортка ≈ 1 017 мм

Технічні вимоги Шпилька кл. 5.8, оцинкована, різьба по всій довжині.

1. ФМ1-3 — збірний варіант фундаменту ФМ1 (КБ, арк. 3): розміри, бетон і армування — за КБ; закладні шпильки, монтажна петля і гідроізоляція виконуються в цеху. Застосування збірного варіанта погодити з ГІП.
2. Бетон С16/20, F75, W4 на сульфатостійкому цементі; захисний шар — 25 мм (КБ). Об’єм блока 0,272 м³, маса ≈ 670 кг; 20 шт.
3. Шпильки встановлювати по кондуктору КД1: відхилення осей ±2 мм, вертикальність — 1:200; різьбу виступаючої частини захистити від бетону.
4. Верх підколонника — рівний, горизонтальний, відхилення позначки ±5 мм.
5. Гідроізоляція — бітумна мастика у 2 шари на всі поверхні, крім верхньої грані підколонника (3,2 м² на блок).
6. Розпалублення, відвантаження і монтаж — при міцності бетону не менше 70 % проєктної (КБ, п. 10).
7. Монтаж: дно ями −1,230, щебінь фр. 20–40 мм 100 мм з ущільненням до −1,130, постіль з ЦПР 1:4 30 мм, низ блока −1,100. Строповка за петлю ПТ1; після встановлення петлю зрізати врівень з бетоном.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
Н. контр.					
ГІП					

36/26-КМД

Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	11	12

Фундамент ФМ1-3. Опалубка, закладні вироби

Формат А3
