
Розріз 1-1 (армування за КБ, арк. 3) М 1:10

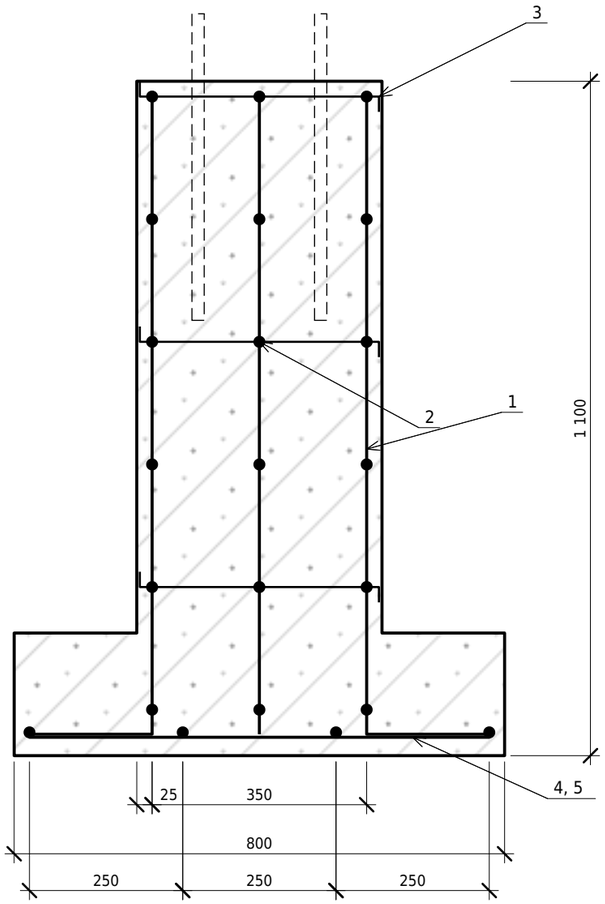

Поз. 2 — 6 рівнів по 3 стрижні (18 шт.), як на розрізі КБ;

у КБ підписано «крок 250» — рівні уточнити в ГІП.

Шпильки ШП1 і петля ПТ1 — арк. 11 (штрихом).

Специфікація ФМ1-3 (на 1 блок)

Поз.	Позначення	Найменування	К-сть	Маса 1, кг	Маса, кг
1	ДСТУ 3760:2006	Ø10 A500C, L = 1 250 — вертикальні з відгином у підошву	6	0,771	4,63
2	ДСТУ 3760:2006	Ø6 A240C, L = 380 — поперечні, крок 250	18	0,084	1,52
3	ДСТУ 3760:2006	Ø6 A240C, L = 450 — шпильки з гаками 75, крок 500×500 у шаховому порядку	6	0,100	0,60
4	ДСТУ 3760:2006	Ø10 A500C, L = 750 — сітка підошви, крок 250	5	0,463	2,31
5	ДСТУ 3760:2006	Ø10 A500C, L = 750 — сітка підошви, крок 250	3	0,463	1,39
ПТ1	ДСТУ 3760:2006	Петля Ø14 A240C, L = 1 017	1	1,23	1,23
ШП1		Шпилька М20×500, кл. 5.8, цинк	4	1,23	4,93
		Гайка М20 (анкерна)	4	0,06	0,26
Ш1	арк. 8	Шайба-пластина 60×60×6	4	0,15	0,61
		Бетон С16/20, F75, W4 (сульфатостійкий цемент)	0,272 м³		
		Мастика бітумна, 2 шари × 1,5 кг/м² × 3,2 м²	9,6 кг		

Відомість витрат сталі, кг

Марка	A240C Ø6, Ø14	A500C Ø10	Закладні	Всього 1 шт.	На 20 шт.
ФМ1-3	3,35	8,33	5,80	17,47	349,5

Матеріали на 20 блоків

Найменування	Од.	К-сть
Бетон С16/20, F75, W4 на сульфатостійкому цементі	м³	5,44
Арматура A500C Ø10	кг	166,6
Арматура A240C Ø6	кг	42,4
Арматура A240C Ø14 (петлі)	кг	24,6
Шпильки М20×500 / гайки М20 / шайби Ш1	шт.	80 / 80 / 80
Мастика бітумна	кг	192
Дріт в’язальний	кг	2
Маса блока / разом	кг / т	670 / 13,4

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	36/26-КМД		
Розробив						Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив							Р	12	12
Н. контр.						Фундамент ФМ1-3. Армування, специфікація			
ГІП									

Формат А3
